

COMUNE DI PORCARI
(PROVINCIA DI LUCCA)

**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA ROMANA OVEST E
OPERE COMPLEMENTARI**

CIG: 7820028B3E

CUP: H61B19000040005

IMPRESA APPALTATRICE:

CLD STRADE s.r.l.

con sede in via di Granuccio, snc, loc. Ospedaletto - 56121 PISA – P.I. 02290760467

CONTRATTO:

Rep. N. 4073 del 24/04/2019

IMPORTO DI PROGETTO DEI LAVORI:

euro 65.370,65

IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI IN VARIANTE:

euro 65.398,02

di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso:

euro 3.000,00

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 14, c. 1, let. e), Reg. LL.PP. D.M. 07/03/2018, n. 49; art. 102, c. 2, D.lgs. 18/04/2016, n. 50)

Premesse

Con Deliberaz. G.C. n. 33 del 13/03/2019 l'Amministrazione comunale di Porcari approvava il progetto esecutivo di **LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA ROMANA OVEST E OPERE COMPLEMENTARI**, comportante un impegno finanziario complessivo di euro 80.000,00 come dettagliato nel quadro economico generale allegato al progetto medesimo:

A	LAVORI IN APPALTO	Importo
A1	Importo dei lavori a base d'asta	€ 62.370,65
A3	Oneri della sicurezza (ex D.Lgs. 81/2008 - non soggetti a ribasso d'asta)	€ 3.000,00
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 65.370,65

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A. C. PER:	
B1	Lavori in economia previsti dal progetto, esclusi dall'appalto, IVA inclusa	€ 0,00
B2	Rilievi, accertamenti, indagini (geognostiche, geotecniche, sismiche) e relazione geologica, ecc. IVA inclusa	€ 0,00
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
B4	Imprevisti, varianti, ecc. (IVA inclusa)	€ 63,40
B5	Acquisizioni aree o immobili	€ 0,00
B6	Accantonamenti di cui all'art. 133, c. 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.	€ 0,00
B7.1	Spese tecniche per incarichi esterni comprendenti: progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase progettuale, Direzione dei lavori (inclusa emissione C.R.E.), assistenza giornaliera e contabilità, coordinamento Sicurezza dei lavori in fase esecutiva.	€ 4.998,01
B7.2.a	Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno (R.U.P., programmazione, validazioni progettuali, procedure di gara e di esecuzione del contratto ecc.) ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 .	€ 1.045,93
B7.2.b	Fondo per l'innovazione ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 .	€ 261,48
B7.2.c	Quota parte incentivi spettanti alla S.U.A. ai sensi dell'art. 113 comma 5 del D. Lgs. 50/2016	€ 0,00
B8	Spese per attività di consulenza o di supporto alle procedure di esproprio, frazionamenti, vulture, accatastamenti... ecc.	€ 0,00
B9	Spese per assicurazione del Validatore interno a carico A.C.	€ 350,00

B10	Spese per pubblicità, per contributo ANAC e, ove previsto, per opere artistiche	€ 30,00
B.11.a	Spese per incarico esterno di collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00
B.11.b	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, dal collaudo statico e da altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00
B12.1	IVA (10%) su importo lavori in appalto	€ 6.537,07
B12.2	C.N.P.A.I.A. (4%) e IVA (22%) su spese tecniche (B7.1 e B.11.a.) per incarichi esterni	€ 1.343,47
	IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 14.629,35

	IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO	€ 80.000,00
--	--	--------------------

A seguito di gara d'appalto appositamente espletata, con determinazione dirigenziale n. 163 del 28/03/2019 i lavori venivano definitivamente aggiudicati all'Impresa CLD STRADE s.r.l. (P.I. 02290760467), con sede in via di Granuccio, snc, loc. Ospedaletto - 56121 PISA. Conseguentemente all'espletamento della gara il quadro economico generale risultava così modificato in conseguenza del ribasso di gara del 6,10% sull'importo a base d'asta di € 62.370,65:

A	LAVORI IN APPALTO	Importo
A1	Importo dei lavori a base d'asta	€ 58.566,04
A3	Oneri della sicurezza (ex D.Lgs. 81/2008 - non soggetti a ribasso d'asta)	€ 3.000,00
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 61.566,04

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A. C. PER:	
B1	Lavori in economia previsti dal progetto, esclusi dall'appalto, IVA inclusa	€ 0,00
B2	Rilievi, accertamenti, indagini (geognostiche, geotecniche, sismiche) e relazione geologica, ecc. IVA inclusa	€ 0,00
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
B4	Imprevisti, varianti, ecc. (IVA inclusa)	€ 4.248,47
B5	Acquisizioni aree o immobili	€ 0,00
B6	Accantonamenti di cui all'art. 133, c. 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.	€ 0,00
B7.1	Spese tecniche per incarichi esterni comprendenti: progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva ed esecutiva, ccordinamento sicurezza in fase progettuale, Direzione dei lavori (inclusa emissione C.R.E.), assistenza giornaliera e contabilità, coordinamento Sicurezza dei lavori in fase esecutiva.	€ 4.998,01
B7.2.a	Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno (R.U.P, programmazione, validazioni progettuali, procedure di gara e di esecuzione del contratto ecc.) ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 .	€ 1.045,93
B7.2.b	Fondo per l'innovazione ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 .	€ 261,48
B7.2.c	Quota parte incentivi spettanti alla S.U.A. ai sensi dell'art. 113 comma 5 del D. Lgs. 50/2016	€ 0,00
B8	Spese per attività di consulenza o di supporto alle procedure di esproprio, frazionamenti, vulture, accatastamenti... ecc.	€ 0,00
B9	Spese per assicurazione del Validatore interno a carico A.C.	€ 350,00
B10	Spese per pubblicità, per contributo ANAC e, ove previsto, per opere artistiche	€ 30,00
B.11.a	Spese per incarico esterno di collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00
B.11.b	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, dal collaudo statico e da altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00
B12.1	IVA (10%) su importo lavori in appalto	€ 6.156,60
B12.2	C.N.P.A.I.A. (4%) e IVA (22%) su spese tecniche (B7.1 e B.11.a.) per incarichi esterni	€ 1.343,47
	IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 18.433,96

	IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO	€ 80.000,00
--	--	--------------------

Il progetto

La progettazione esecutiva è stata svolta dallo scrivente Ing. Francesco Mauro (Ordine Ingg. Lucca, n. A1242). Gli interventi previsti dal progetto sono i seguenti:

- realizzazione di un'isola spartitraffico invalicabile in calcestruzzo, dotata di segnaletica verticale con pannello integrativo delineatore di ostacolo all'intersezione fra via Romana e via di Rughi;
- realizzazione di marciapiede in località Rughi in un tratto della via Romana che ne è sprovvisto;

- realizzazione di una mini rotatoria all'intersezione fra via Romana e via Galgani;
- ulteriori interventi puntuali di messa in sicurezza stradale e ripristino di pavimentazione bituminosa in tratti che presentano ammaloramenti.

Contratto d'appalto

In data 24/04/2019 veniva stipulato con l'Impresa *CLD STRADE s.r.l.* come sopra individuata, il contratto d'appalto rep. n. 4073 per un importo di € 61.566,04. I lavori venivano quindi consegnati in pari data (cfr. verbale prot. n. 7094 del 24/04/2019) con data utile per l'ultimazione fissata al 22/07/2019.

Cauzione definitiva e coperture assicurative

L'Impresa appaltatrice, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il contratto di cui sopra ha costituito, ai sensi dell'art. 103 D.lgs. 50/2016, cauzione definitiva di € 3.078,30 a mezzo di polizza fideiussoria n. 1431758 rilasciata da Elba Assicurazioni s.p.a. in data 15/04/2019.

L'Impresa ha inoltre depositato polizza (redatta secondo lo schema tipo di cui al D.M. 123 del 12/03/2004) n. 1431592 emessa Elba Assicurazioni s.p.a. in data 12/04/2019.

Consegna e durata dei lavori

I lavori venivano consegnati in data 24/04/2019 (cfr. verbale prot. n. 7094 agli atti) con un tempo contrattualmente definito in 90 giorni naturali e consecutivi e quindi con data utile per l'ultimazione fissata al 22/07/2019.

Sospensioni e riprese dei lavori

Come risulta dai verbali agli atti i lavori sono stati sospesi dal 19/07/2019 al 05/08/2019 (18 giorni) per redazione perizia di variante e suppletiva (vedasi oltre).

Svolgimento dei lavori

L'esecuzione dei lavori si è svolta con regolarità e non si sono verificati incidenti di sorta o situazioni di impedimento tecnico tali da costituire elemento di rilievo ai fini della buona riuscita dell'opera.

Variante in corso d'opera

Durante lo svolgimento dei lavori sono state disposte alcune modifiche di dettaglio, rientranti nei poteri discrezionali del direttore dei lavori e non comportanti modifica dell'importo contrattuale rientrando quindi nella fattispecie delle *modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale* di cui all'art. 8, c. 7 del D.M. 49/2018. Sono tuttavia sopravvenute anche alcune circostanze imprevedibili in fase progettuale che si vanno qui a descrivere:

- effettuate piccole demolizioni necessarie a collegare il nuovo impianto previsto in progetto al palo di pubblica illuminazione adiacente, si constatava che detto palo era interessato da un fenomeno di corrosione alla base tale da comprometterne la stabilità;
- si rendeva quindi necessario sostituire detto palo, previa rimozione dell'armatura stradale, sostituendolo con uno nuovo di geometria simile, al fine di non modificare le condizioni attuali di illuminazione;
- dato che doveva procedersi a una sostituzione, si riteneva opportuno dotare detto palo di dispositivo per l'alimentazione diurna di servizi a valore aggiunto, dotato di batteria tampone.

Rimandando al relativo computo metrico per i dettagli si precisa che le modifiche descritte hanno comportano un maggior importo rispetto all'importo contrattuale di € 3.831,98, con un incremento del 6,22%. Si precisa comunque che le modifiche di cui sopra non hanno carattere sostanziale sia perché relative ad aspetti di dettaglio da risolversi a seguito di circostanze sopravvenute, sia perché dal punto di vista normativo non soddisfano alcuna delle condizioni di cui all'art. 106, c. 4 del D.lgs. 50/2016; soprattutto però, dette modifiche permettono di conseguire pienamente i prefissati obiettivi di miglioramento della sicurezza stradale nel tratto oggetto di studio.

Dal punto di vista procedurale, accertata con il Responsabile del Procedimento la disponibilità delle risorse necessarie rimodulando il quadro economico di progetto senza aumento della spesa complessiva prevista, si è quindi redatta la perizia suppletiva che è riconducibile alla fattispecie contemplata dall'art. 106, c. 1, let. c) del D.lgs. 50/2016.

Detta perizia è stata approvata con determina dirigenziale n. 163 del 01/08/2019, e il quadro economico risulta modificato come segue, senza variazione dell'importo complessivo:

A	LAVORI IN APPALTO	Importo
A1	Importo dei lavori a base d'asta	€ 62.398,02
A3	Oneri della sicurezza (ex D.Lgs. 81/2008 - non soggetti a ribasso d'asta)	€ 3.000,00
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 65.398,02

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A. C. PER:	
B1	Lavori in economia previsti dal progetto, esclusi dall'appalto, IVA inclusa	€ 0,00
B2	Rilievi, accertamenti, indagini (geognostiche, geotecniche, sismiche) e relazione geologica, ecc. IVA inclusa	€ 0,00
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
B4	Imprevisti, varianti, ecc. (IVA inclusa)	€ 33,29
B5	Acquisizioni aree o immobili	€ 0,00
B6	Accantonamenti di cui all'art. 133, c. 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.	€ 0,00
B7.1	Spese tecniche per incarichi esterni comprendenti: progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase progettuale, Direzione dei lavori (inclusa emissione C.R.E.), assistenza giornaliera e contabilità, coordinamento Sicurezza dei lavori in fase esecutiva.	€ 4.998,01
B7.2.a	Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno (R.U.P, programmazione, validazioni progettuali, procedure di gara e di esecuzione del contratto ecc.) ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 .	€ 1.045,93
B7.2.b	Fondo per l'innovazione ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 .	€ 261,48
B7.2.c	Quota parte incentivi spettanti alla S.U.A. ai sensi dell'art. 113 comma 5 del D. Lgs. 50/2016	€ 0,00
B8	Spese per attività di consulenza o di supporto alle procedure di esproprio, frazionamenti, vulture, accatastamenti... ecc.	€ 0,00
B9	Spese per assicurazione del Validatore interno a carico A.C.	€ 350,00
B10	Spese per pubblicità, per contributo ANAC e, ove previsto, per opere artistiche	€ 30,00
B.11.a	Spese per incarico esterno di collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00
B.11.b	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, dal collaudo statico e da altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00
B12.1	IVA (10%) su importo lavori in appalto	€ 6.539,80
B12.2	C.N.P.A.I.A. (4%) e IVA (22%) su spese tecniche (B7.1 e B.11.a.) per incarichi esterni	€ 1.343,47
	IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 14.601,98

	IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO	€ 80.000,00
--	--	--------------------

Proroghe

Conseguentemente alla redazione della perizia, tenuto anche conto del tempo che l'Impresa ha dovuto dedicare alle verifiche e ai riscontri che sono stati necessari, è stata concessa una proroga del termine contrattuale di cinque giorni naturali e consecutivi.

Tenuto conto delle sospensioni e delle proroghe concesse il termine contrattuale è stato posticipato al 13/08/2019.

Nuovi prezzi

Per la redazione della perizia è stato necessario introdurre n. 2 nuovi prezzi come risulta dal verbale, compilato e siglato in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8, c. 5 del D.M. 49/2018 e acquisito agli atti d'ufficio.

Spesa autorizzata per i lavori

La spesa autorizzata per i lavori risulta di € 65.398,02 (euro sessantacinquemilatrecentonovantotto/02), I.V.A. esclusa, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori, come riportato dall'apposito verbale acquisito agli atti d'ufficio, è avvenuta in data 12/08/2019, che risulta precedente a quella prevista dal contratto d'appalto di 1 (uno) giorni.

In occasione del sopralluogo effettuato si prendeva atto che per l'effettivo completamento delle lavorazioni mancavano alcune sistemazioni stradali e alcune opere accessorie relative all'impianto di illuminazione e alla sistemazione a verde dell'isola centrale della rotatoria, per la quale il periodo non era favorevole dal punto di vista climatico. Si tratta di lavorazioni di piccola entità rispetto all'appalto complessivo, tali da non compromettere la fruibilità in sicurezza delle opere realizzate, e

che l'Impresa appaltatrice si impegnava a concludere a perfetta regola d'arte, **entro sessanta giorni** come previsto dall'art. 12, c. 1 del Regolamento emanato con D.M. n. 49 del 07/03/2018.

In data 18/09/2019 lo scrivente effettuava un sopralluogo sul cantiere constatando in contraddittorio con l'Impresa l'effettiva conclusione dei lavori in tempo utile rispetto a quanto previsto dall'articolo sopra citato.

Infortuni

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Assicurazioni infortuni

L'Impresa appaltatrice ha provveduto ad assicurare la propria manodopera presso l'I.N.A.I.L. di Pisa: matricola 19115952, P.A.T. 21572362.

Responsabile del procedimento, direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza

Le funzioni Responsabile del procedimento sono state svolte dal Dirigente del Settore LL.PP. del Comune di Porcari, Ing. Fulvio D'Angelo.

I lavori sono stati diretti per tutta la loro durata dallo scrivente, che ha svolto anche la funzione di coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione dell'opera.

Considerazioni sull'esecuzione dei lavori

In merito all'esecuzione dei lavori previsti dal contratto si rileva che gli stessi sono stati svolti con regolarità e senza contestazioni da parte dello scrivente direttore dei lavori.

Avvisi ai creditori

Non è stata necessaria la pubblicazione di avvisi ai creditori di cui all'art. 218 del D.P.R. 207/2010 poiché durante i lavori non sono state necessarie occupazioni permanenti o temporanee di proprietà private, né si sono prodotti danni a carico di terzi.

Ordini di servizio

Durante lo svolgimento dei lavori sono stati emessi n. 3 (tre) ordini di servizio alle cui prescrizioni l'Impresa appaltatrice ha prontamente ottemperato.

Riserve

Durante lo svolgimento dei lavori non sono state apposte sul registro di contabilità riserve da parte dell'Impresa appaltatrice.

Stato finale dei lavori

In data 18/09/2019 è stato redatto lo stato finale dei lavori di cui al contratto d'appalto, dal quale risulta che l'ammontare netto dei lavori eseguiti, compresi gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, è di € 65.398,02 da cui, detraendo l'ammontare degli acconti corrisposti, pari ad € 65.071,03, resta un credito per l'Impresa esecutrice di € 326,99 (euro trecentoventisei/99). Detto credito è stato accettato senza riserve dall'impresa, che ha firmato lo stato finale medesimo.

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa

Importo netto autorizzato per lavori	€	65.398,02
Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€	65.398,02
con una minore spesa di	€	0,00.

Regolarità contributiva

L'Impresa appaltatrice può essere ritenuta in regola con i versamenti agli enti previdenziali e assicurativi, come risulta dal D.U.R.C. prot. n. INPS_17086704 del 10/09/2019 che l'Impresa medesima ha fornito al sottoscritto direttore dei lavori.

Cessioni dei crediti

Alla data del 18/09/2019 non è pervenuta alla direzione lavori alcuna comunicazione o notifica da cui risulti che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno **duemiladiciannove (2019)**, il mese di **settembre (09)**, il giorno **diciannove (19)**, il sottoscritto ing. Francesco Mauro, iscritto all'albo dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Lucca al n. 1242, direttore dei lavori di cui trattasi,

- visti gli articoli 229 e segg. del regolamento LL.PP. emanato con D.P.R. 207/2010;
- visto il contratto in data 24/04/2019, rep. n. 4073, dal quale risulta che l'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta è di € 61.566,04 (euro sessantunomilacinquecentosessantasei/04) e che il tempo utile concesso per l'ultimazione è pari a 90 (novantai) giorni naturali e consecutivi;
- visto il verbale di consegna dei lavori redatto in data 24/04/2019, prot. n. 7094;
- vista la perizia di variante redatta dallo scrivente direttore dei lavori ai sensi dell'art. 106, c. 1, let. c) del D.lgs. 50/2016, approvata con determina dirigenziale n. 163 del 01/08/2019, in conseguenza della quale l'importo contrattuale risulta di € 65.370,65 compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- visto il certificato di ultimazione dei lavori emesso in data 12/08/2019 dal quale risulta che gli stessi sono stati ultimati in pari data e - considerato il tempo utile contrattualmente stabilito in giorni 90 (novanta) oltre ai giorni di sospensione e alla proroga concessa in sede di approvazione della perizia di variante - in tempo utile;
- visto che per quanto riguarda le posizioni assicurative degli operai l'impresa ha provveduto alla regolare iscrizione di tutta la mano d'opera utilizzata come risulta dal DURC prot. n. INPS_17086704 del 10/09/2019;
- considerata la cauzione definitiva di € 3.078,30 a mezzo di polizza fideiussoria n. 1431758 rilasciata da Elba Assicurazioni s.p.a. in data 15/04/2019;
- visti gli atti della contabilità dei lavori:
 - a) n. 1 libretti delle misure;
 - b) registro di contabilità;
 - c) n. 1 SAL emessi in ottemperanza a quanto prescritto dal contratto d'appalto;
 - d) stato finale redatto in data 18/09/2019, dal quale risulta che il credito residuo dell'impresa ammonta ad € 326,99 (euro trecentoventisei/99) al netto dell'I.V.A.;
- visto l'art. 21 del capitolato speciale d'appalto che stabilisce in tre mesi dall'ultimazione dei lavori il termine entro il quale deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione;
- vista la dichiarazione di conformità dell'impianto di illuminazione, n. 48/19 rilasciata dalla Ditta installatrice MR Elettromeccanica s.r.l. ai sensi dell'art. 2 della legge 186/68 e corredata da relazione sui materiali utilizzati e certificato di riconoscimento dei requisiti professionali della Ditta installatrice medesima (documentazione che si allega al presente atto sub let. A);
- visitati i lavori in contraddittorio con l'impresa in data 18/09/2019, espletati i necessari controlli ed eseguite le opportune verifiche;
- controllata in particolare, con esito positivo, l'installazione presso l'intersezione fra via Romana Ovest e via Galgani della telecamera IP *Bullet HIKVISION Raptor*, 4Mpx IR 30 m; varifocal 2.8-12 mm motorizzata, completa di n. 2 antenne direttive integrate 23 dBi, modulazione 300 Mbps, interfaccia Ethernet 10/300 Mbps con alimentatore 24 V 0,8 A; Switch poe; gruppo di continuità UPS Legrand e corpo batterie tampone, esattamente corrispondente al modello indicato in progetto quale standard di qualità e perfettamente compatibile con il sistema di telecamere di sorveglianza già in uso;

- considerato quindi che i lavori sopra indicati ed eseguiti dall'impresa CLD STRADE s.r.l., con sede in via di Granuccio, snc, loc. Ospedaletto - 56121 PISA – P.I. 02290760467, corrispondono a quelli indicati dal progetto e dalla perizia di variante approvata;
- constatato che le registrazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere e che le stesse opere risultano realizzate con materiali idonei posti in opera conformemente alle prescrizioni contrattuali;
- constatato che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata sulla base dei prezzi contrattualmente stabiliti, e che dopo la revisione tecnico-contabile dei documenti sopra indicati e la compilazione del conto finale, accettato senza riserve dall'impresa, l'importo dei lavori è confermato in € 65.398,02 (euro sessantacinquemilatrecentonovantotto/02) oltre I.V.A.;
- considerato che tale ammontare rientra nei limiti delle somme regolarmente autorizzate;

CERTIFICA

che i lavori sopra indicati sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa CLD STRADE s.r.l., con sede in via di Granuccio, snc, loc. Ospedaletto - 56121 PISA – P.I. 02290760467, in ottemperanza al contratto d'appalto rep. n. 4073 del 22/04/2019 e ne liquida il relativo importo complessivo fissato in € 65.398,02 (euro sessantacinquemilatrecentonovantotto/02) netti, da cui detraendo gli acconti corrisposti in corso d'opera per un totale di € 65.071,03 (euro sessantacinquemilasettantuno/03), resta il credito di € 326,99 (euro trecentoventisei/99) oltre I.V.A. 10%, per un totale di € 359,69 (euro trecentocinquantanove/69) che, salvo la superiore approvazione del presente atto, può pagarsi all'Impresa esecutrice di cui sopra a saldo di ogni suo avere.

Con l'approvazione del presente certificato di regolare esecuzione può essere disposto lo svincolo delle cauzioni definitive prestate all'atto della stipula dei contratti di appalto.

Data della sottoscrizione digitale del documento: 23/09/2019

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Francesco Mauro

L'IMPRESA

CLD Strade s.r.l., il Legale Rappresentante

Andrea Scatena

P.P.V., IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Fulvio D'Angelo



ELETTROMECCANICA s.r.l.
 Impianti elettrici civili e industriali, automazione cancelli elettrici
 Impianti antintrusione e antincendio, impianti TV / SAT
 Impianti telefonici e trasmissione dati

via Romana Ovest, 52 - 55016 PORCARI (LU)
 tel. 0583 297589 fax 0583 294259 - Cap. Soc. € 90.000,00 i.v.
 e-mail: mrelettromeccanica@alice.it
 C.F./P.IVA 02015750462 - REG. IMPRESE LUCCA 02015750462 - REA LU 189948

DICHIARAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO ALLA REGOLA DELL'ARTE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' FACOLTATIVA AI SENSI DELLA LEGGE
 1° MARZO 1968 N.186/68 PER GLI IMPIANTI ESCLUSI DALL'AMBITO DI
 APPLICAZIONE DEL DM 22 GENNAIO 2008, N.37.

n. 48/19

Il sottoscritto MARCHINI RICCARDO titolare o legale rappresentante

dell'impresa (ragione sociale) M.R.ELETTROMECCANICA s.r.l.

operante nel settore ELETTROTECNICO

con sede in via ROMANA OVEST n. 52 comune PORCARI

(Prov.) LU tel. 0583/297589

part. IVA | 02015750462 |

Iscrizione al Registro delle Imprese di LUCCA (d.p.r. 7/12/1995) N. | 02015750462

Iscritta all'albo Provinciale delle Imprese Artigiane di LUCCA (l. 8/8/1985 n.443) N. | 59156

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) illuminazione pubblica rotatoria in loc.Rughi, Comune di Porcari

inteso come: nuovo impianto trasformazione ampliamento manutenzione straordinaria altro (1) _____

commissionato da CLD STRADE SRL, installato nei locali siti

nel Comune di PORCARI (prov. LU) via INTERSERZIONE TRA VIA GALGANI E VIA
 ROMANA OVEST - LOC.RUGHI di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo) COMUNE DI
 PORCARI P.ZZA FELICE ORSI - PORCARI - LUCCA

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola d'arte, tenuto conto delle condizioni d'esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio avendo in particolare:

- seguito dalla normativa tecnica applicabile all'impiego
- installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione
- controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.
- rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da (2) (ing. Francesco Mauro iscritto all'albo dell'ordine degli ingegneri di Lucca n. 1242)

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

data 19/09/2019

il resp. tecnico

M. R. elettromeccanica srl
 Via Romana Ovest n. 52 - PORCARI (LU)
 Tel. 0583/297589 - Fax 0583/294259
 Part. IVA 02015750462

il dichiarante

M. R. elettromeccanica srl
 Via Romana Ovest n. 52 - PORCARI (LU)
 Tel. 0583/297589 - Fax 0583/294259
 Part. IVA 02015750462

Porcari li, 19 settembre 2019

Relazione delle tipologie dei materiali utilizzati per la realizzazione di illuminazione pubblica in via intersezione tra via Galgani e via Romana Ovest loc.Rughi – Porcari (LU) commissionato da CLD Strade srl e di proprietà del Comune di Porcari.

MATERIALE	MARCA	GRAD. PROT.
Cavo FG16OR16 per trasporto di energia di varie sezioni rispondente allenorme CEI 20-13 IEC 60502-1	Baldassarri	-----
Cassette di derivazione stagne da parete serie 44 CE rispondenti alle norme internazionali IEC 60670-1 (CEI 23-48) e IEC 60670-22 (CEI 23-94)	Gewiss	-----
Faretto da incasso in acciaio a led carrabile a marchio CE	Gifas Elettric	IP68
Faretto led carrabile con dissipatore in alluminio da incasso a marchio CE	Silamp	IP65
Scatole di derivazione lisci in tecnopolimeto isolante autoestinguente con coperchio opaco o trasparente rispondenti alle normative CEI EN 60695 - 2 -1 con grado di protezione secondo norme CEI EN 60529	Schneider Electric	IP56

M. R. elettromeccanica srl
Via Romana Ovest, n. 52 - PORCARI (LU)
Tel. 0583/297589 - Fax 0583/294259
Part. I.V.A. 02015750462

In questa pagina viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente scopo di sintesi

VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE

**M.R. ELETTROMECCANICA
S.R.L.**



3VX904

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'iscrizione. Per la verifica utilizzare l'App QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale PORCARI (LU) VIA ROMANA OVEST 52 CAP 55016
Indirizzo PEC mrelettromeccanica@postacert.vodafone.it
Numero REA LU - 189948
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese 02015750462
Partita IVA 02015750462
Forma giuridica societa' a responsabilita' limitata
Data atto di costituzione 30/12/2005
Data iscrizione 18/01/2006
Data ultimo protocollo 28/07/2018
Amministratore Unico MARCHINI RICCARDO

ATTIVITA'

Stato attività attiva
Data inizio attività 31/12/2005
Attività esercitata elettromeccanica, idraulico e impianti elettrici, telefonici, trasmissione dati, impianti di allarme e antifurto, impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, antenne ed impianti di protezione da scariche atmosferiche, impianti di ...
Codice ATECO 43.21.01
Codice NACE 43.21
Attività import export -
Contratto di rete -
Albi ruoli e licenze sì
Albi e registri ambientali sì

L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale 90.000,00
Addetti al 31/12/2018 16
Soci 2
Amministratori 1
Titolari di cariche 0
Sindaci, organi di controllo 0
Unità locali 1
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi 0
Trasferimenti di quote 0
Trasferimenti di sede 0
Partecipazioni (1) -

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA -
Certificazioni di QUALITA' -

DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - ...
Fascicolo sì
Statuto sì
Altri atti 2

Servizio realizzato da InfoCamere per conto della Camera di Commercio Italiana
Documento n. T.313518154 estratto dal Registro Imprese in data 19/04/2019

(1) Da elenchi soci e trasferimenti di quote

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n. T.313518154
estratto dal Registro Imprese in data 19/04/2019

M.R. ELETTROMECCANICA S.R.L.
Codice Fiscale 02015750462

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 18/01/2006
Annotata con la qualifica di IMPRESA ARTIGIANA (sezione speciale) il 20/01/2006 con decorrenza dal 06/02/2006

informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 30/12/2005

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2030

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2006
Scadenza esercizi successivi: 31/12

forme amministrative

amministratore unico (in carica)
Numero minimo amministratori: 1
Numero massimo amministratori: 1
piu' amministratori
Numero minimo amministratori: 2
Numero massimo amministratori: 2
consiglio di amministrazione
Numero minimo amministratori: 2
Numero massimo amministratori: 5

Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ATTIVITA' DI:
- ELETTROMECCANICA, IDRAULICO E IMPIANTI ELETTRICI, IMPIANTI TELEFONICI, TRASMISSIONE DATI, IMPIANTI ALLARMI E ANTIFURTO;
- IMPIANTI RADIOTELEVISIVI ED ELETTRONICI IN GENERE, ANTENNE ED IMPIANTI DI PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE;
- IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO LIMITATAMENTE ALLA PARTE ELETTRONICA;
- IMPIANTI DI TRASPORTO DI DISTRIBUZIONE E DI UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI A PARTIRE DAL PUNTO DI CONSEGNA DELL'ENERGIA FORNITA DALL'ENTE DISTRIBUTORE;
- IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI CLIMATIZZAZIONE AZIONATI DA FLUIDO LIQUIDO, AERIFORME, GASSOSO E DI QUALSIASI ALTRA NATURA O SPECIE;
- IMPIANTI IDROSANITARI NONCHE' QUELLI DI TRASPORTO, DI TRATTAMENTO, DI USO, DI ACCUMULO E DI CONSUMO DELL'ACQUA ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI A PARTIRE DAL PUNTO DI CONSEGNA DELL'ACQUA FORNITA DALL'ENTE DISTRIBUTORE.
ESSA INOLTRE, AL SOLO FINE DEL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, POTRA' COMPiere TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI ED IMMOBILIARI, RITENUTE NECESSARIE O UTILI DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE ED IN TALE AMBITO, IN VIA NON PREVALENTE E NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, POTRA' INOLTRE COMPiere QUALUNQUE OPERAZIONE FINANZIARIA E ASSUMERE PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' AVVENTI OGGETTO ANALOGO O COMONQUE CONNESSO AL PROPRIO, NONCHE' PRESTARE GARANZIE ANCHE A FAVORE DI TERZI, IL TUTTO COM ESCLUSIONE DELLO SVOLGIMENTO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DI QUALUNQUE ATTIVITA' QUALIFICATA COME FINANZIARIA DALLA LEGGE.

Poteri

poteri da statuto o da patti sociali

L'ORGANO AMMINISTRATIVO HA TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, SALVE LE LIMITAZIONI DELIBERATE DALL'ASSEMBLEA AL MOMENTO DELLE NOMINE.
IN OGNI CASO SONO RISERVATE ALL'ASSEMBLEA LE DECISIONI DI COMPiere OPERAZIONI CHE comportano una sostanziale modificazione dell'OGGETTO SOCIALE O UNA RILEVANTE MODIFICAZIONE DEI DIRITTI DEI SOCI E TUTTE LE ALTRE DECISIONI RISERVATE PER LEGGE O PER STATUTO ALLA STESSA.
LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA ALL'AMMINISTRATORE UNICO.

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n. T.313518154
estratto dal Registro Imprese in data 19/04/2019

M.R. ELETTROMECCANICA S.R.L.
Codice Fiscale 02015750462

Indice

1 Sede	3
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo	3
3 Capitale e strumenti finanziari	5
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote	5
5 Amministratori	6
6 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri	6
7 Attività, albi ruoli e licenze	7
8 Aggiornamento impresa	10

1 Sede

Indirizzo Sede legale PORCARI (LU)
VIA ROMANA OVEST 52 CAP 55016
Indirizzo PEC mrelettromeccanica@postacert.vodafone.it
Partita IVA 02015750462
Numero repertorio economico amministrativo (REA) LU - 189948

2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese Codice fiscale e numero di iscrizione: 02015750462
Data di iscrizione: 18/01/2006
Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA, Annotata con la qualifica di IMPRESA ARTIGIANA (sezione speciale)
Estremi di costituzione Data atto di costituzione: 30/12/2005
Sistema di amministrazione amministratore unico (in carica)
piu' amministratori
consiglio di amministrazione
Oggetto sociale LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ATTIVITA' DI:
- ELETTROMECCANICA, IDRAULICO E IMPIANTI ELETTRICI, IMPIANTI TELEFONICI, TRASMISSIONE DATI, IMPIANTI ALLARMI E ANTIFURTO;
...
L'ORGANO AMMINISTRATIVO HA TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, SALVE LE LIMITAZIONI DELIBERATE DALL'ASSEMBLEA AL MOMENTO DELLE NOMINE.
...
Poteri da statuto o da patti sociali


Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02015750462
del Registro delle Imprese di LUCCA
Data iscrizione: 18/01/2006

3 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro	Deliberato:	90.000,00
	Sottoscritto:	90.000,00
	Versato:	90.000,00
	Conferimenti in natura	

4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

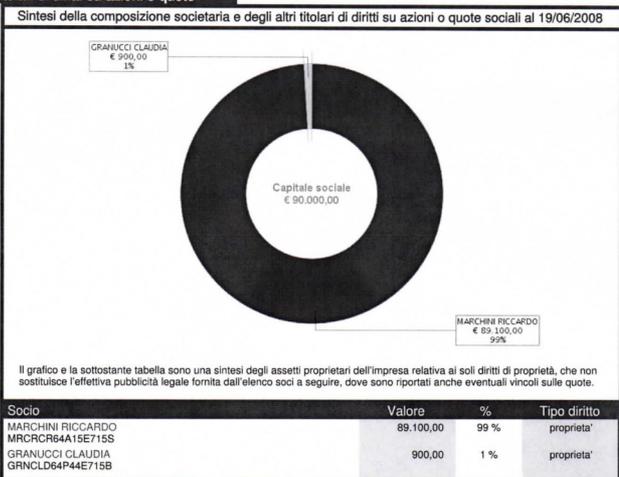

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 19/06/2008 pratica con atto del 19/06/2008

Data deposito: 10/07/2008
 Data protocollo: 11/07/2008
 Numero protocollo: LU-2008-16852
 L'impresa ha depositato, insieme al bilancio, dichiarazione che l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali alla data dell'atto non è variato rispetto all'ultimo depositato

capitale sociale
 Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: 90.000,00 Euro

Proprietari
 Quota di nominali: 89.100,00 Euro

MARCHINI RICCARDO

Codice fiscale: MRCRCR64A15E715S
 Tipo di diritto: proprietà

Proprietari GRANUCCI CLAUDIA

Quota di nominali: 900,00 Euro
 Codice fiscale: GRNCLD64P44E715B
 Tipo di diritto: proprietà

5 Amministratori

Amministratore Unico MARCHINI RICCARDO

Forma amministrativa adottata amministratore unico

Numero amministratori in carica: 1
 Durata in carica: a tempo indeterminato

Elenco amministratori

Amministratore Unico MARCHINI RICCARDO

residenza

Nato a LUCCA (LU) il 15/01/1964
 Codice fiscale: MRCRCR64A15E715S
 CAPANNORI (LU)
 VIA DEI SELMI 35 CAP 55012 LAMMARI

carica

amministratore unico
 Nominato con atto del 30/12/2005
 Durata in carica: a tempo indeterminato

carica

responsabile tecnico
 Nominato il 31/12/2005
 responsabile tecnico per l'esercizio delle attività di cui alla lettera A, B, C, D, E, G Limitatamente a tutte le voci delle lettere ad esclusione degli impianti di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione e aerazione dei locali
 Ente: CAMERA DI COMMERCIO

6 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri

Trasferimenti d'azienda e compravendite

Tipo di atto	Data atto	Nr protocollo	Cedente	Cessionario
conferimento	30/12/2005	LU-2006-2644	MARCHINI RICCARDO C.F. MRCRCR64A15E715S	M.R. ELETTROMECC. S.R.L. C.F. 02015750462

Trasferimenti di proprietà o godimento d'azienda

conferimento estremi della pratica

Data atto: 30/12/2005
 Data protocollo: 31/01/2006
 Data deposito: 27/01/2006
 Numero protocollo: LU-2006-2644

estremi ed oggetto dell'atto

Notaio: MIGNONE ALDO
 Numero repertorio: 13273
 Cedente: MARCHINI RICCARDO
 Codice fiscale: MRCRCR64A15E715S
 Cessionario: M.R. ELETTROMECCANICA S.R.L.
 Codice fiscale: 02015750462

7 Attività, albi ruoli e licenze

Addebi	16
Data d'inizio dell'attività dell'impresa	31/12/2005
Attività esercitata	ELETTROMECCANICA, IDRAULICO E IMPIANTI ELETTRICI, TELEFONICI, TRASMISSIONE DATI, IMPIANTI DI ALLARME E ANTIFURTO, IMPIANTI RADIOTELEVISIVI ED ELETTRONICI IN GENERE, ANTENNE ED IMPIANTI DI PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE, IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO LIMITATAMENTE ALLA PARTE ELETTRONICA, IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE, TRASPORTO E UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI A PARTIRE DAL PUNTO DI COSENA DELL'ENERGIA ELETTRICA DAL DISTRIBUTORE, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI CLIMATIZZAZIONE AZIONATI DA FLUIDO LIQUIDO, AREIFORME, GASSOSO E DI QUALSIASI ALTRA NATURA, IMPIANTI IGIENIZZANTI E QUELLI DI TRASPORTO, TRATTAMENTO, USO E ACCUMULO DI ACQUA A PARTIRE DAL PUNTO DI CONSEGNA DEL DISTRIBUTORE.

Attività

inizio attività (informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 31/12/2005

attività esercitata nella sede legale

ELETTROMECCANICA, IDRAULICO E IMPIANTI ELETTRICI, TELEFONICI, TRASMISSIONE DATI, IMPIANTI DI ALLARME E ANTIFURTO, IMPIANTI RADIOTELEVISIVI ED ELETTRONICI IN GENERE, ANTENNE ED IMPIANTI DI PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE, IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO LIMITATAMENTE ALLA PARTE ELETTRONICA, IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE, TRASPORTO E UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI A PARTIRE DAL PUNTO DI COSENA DELL'ENERGIA ELETTRICA DAL DISTRIBUTORE, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI CLIMATIZZAZIONE AZIONATI DA FLUIDO LIQUIDO, AREIFORME, GASSOSO E DI QUALSIASI ALTRA NATURA, IMPIANTI IGIENIZZANTI E QUELLI DI TRASPORTO, TRATTAMENTO, USO E ACCUMULO DI ACQUA A PARTIRE DAL PUNTO DI CONSEGNA DEL DISTRIBUTORE.

Impresa artigiana per le seguenti attività

Data inizio attività artigiana: 31/12/2005

classificazione ATECORI 2007 dell'attività (classificazione desunta dall'attività dichiarata)

Codice: 43.21.01 - installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
 Importanza: prevalente svolta dall'impresa

Codice: 43.21.01 - installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
 Importanza: primaria Albo Artigiani
 Data inizio: 31/12/2005

Codice: 43.21.02 - installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
 Importanza: secondaria Registro Imprese
 Data inizio: 31/12/2005

Codice: 43.22.01 - installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
 Importanza: secondaria Registro Imprese
 Data inizio: 31/12/2005

Codice: 43.29.09 - altri lavori di costruzione e installazione nca
 Importanza: secondaria Registro Imprese
 Data inizio: 31/12/2005

Addetti (elaborazione da fonte INPS)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2018
 (dati rilevati al 31/12/2018)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Valore medio
Dipendenti	14	14	15	15	15
Indipendenti	1	1	0	0	0
Totale	15	15	15	15	16

Distribuzione dipendenti

Distribuzione per Contratto
 (dati in percentuale rilevati al 31/12/2018)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Tempo Determinato	5%	0	7%	4%
Tempo Indeterminato	95%	100%	93%	96%

Distribuzione per Orario di lavoro
 (dati in percentuale rilevati al 31/12/2018)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Tempo Pieno	93%	93%	93%	93%
Tempo Parziale	7%	7%	7%	7%

Distribuzione per Qualifica
 (dati in percentuale rilevati al 31/12/2018)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Operaio	86%	86%	87%	87%
Impiegato	14%	14%	13%	13%

Addetti nel comune di PORCARI (LU) Sede

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Valore medio
Dipendenti	14	14	15	15	15
Indipendenti	1	1	0	0	0
Totale	15	15	15	15	16

Albi e Ruoli

Albo Nazionale Gestori Ambientali (fonte Ministero dell'Ambiente)

Numero iscrizione: FI/018586
Iscritta nella sezione di: FIRENZE

Categoria: 3bis - distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (aee), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (d.m. 3/6/2014 art.8,c.1,lett. c)
Classe: unica
Data inizio: 01/10/2015
Data scadenza: 01/10/2020

Abilitazioni

abilitazioni per gli impianti D.M. 37/2008

L'impresa, ai sensi del Decreto 22 gennaio 2008 n. 37 recante norme per la sicurezza degli impianti, è abilitata, salvo le eventuali limitazioni più sotto specificate, all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'Art. 1 del Decreto n. 37/2008 come segue:

1) Lettera A

impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere

Provincia: LU
Ente: ALBO ARTIGIANI

2) Lettera B

impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere

Provincia: LU
Ente: ALBO ARTIGIANI

3) Lettera C

impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali

Limitatamente a: impianti di riscaldamento, di climatizzazione e di condizionamento di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali

Provincia: LU
Ente: ALBO ARTIGIANI

4) Lettera D

impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie

Provincia: LU
Ente: ALBO ARTIGIANI

5) Lettera E

impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali

Provincia: LU
Ente: ALBO ARTIGIANI

6) Lettera G

impianti di protezione antincendio

Provincia: LU
Ente: ALBO ARTIGIANI

requisiti morali e/o tecnico professionali

Codice: installatori - lettera a (d.m. 37/2008)
Stato: requisiti accertati
Ente: ALBO ARTIGIANI
Data denuncia: 20/01/2006
Data accertamento: 06/02/2006

Codice: installatori - lettera b (d.m. 37/2008)
Stato: requisiti accertati
Ente: ALBO ARTIGIANI
Data denuncia: 20/01/2006
Data accertamento: 06/02/2006

Codice: installatori - lettera c (d.m. 37/2008)
Stato: requisiti accertati
Ente: ALBO ARTIGIANI
Data denuncia: 20/01/2006
Data accertamento: 06/02/2006

Ulteriori specificazioni: limitatamente agli impianti di riscaldamento, climatizzazione e condizionamento di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione e aerazione dei locali

Codice: installatori - lettera d (d.m. 37/2008)
Stato: requisiti accertati
Ente: ALBO ARTIGIANI
Data denuncia: 20/01/2006
Data accertamento: 06/02/2006

Codice: installatori - lettera e (d.m. 37/2008)
Stato: requisiti accertati
Ente: ALBO ARTIGIANI
Data denuncia: 20/01/2006
Data accertamento: 06/02/2006

Codice: installatori - lettera g (d.m. 37/2008)
Stato: requisiti accertati
Ente: ALBO ARTIGIANI
Data denuncia: 20/01/2006
Data accertamento: 06/02/2006

8. Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo 28/07/2018

Totale diritti di segreteria versati alla Camera di Commercio euro 5,00 anticipati da Infocamere S.C.p.A. in nome e per conto dell'Utente

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_16485668	Data richiesta	16/07/2019	Scadenza validità	13/11/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	M.R. ELETTROMECCANICA SRL
Codice fiscale	02015750462
Sede legale	VIA ROMANA OVEST 52 PORCARI LU 55016

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.
